




DECLARAÇÕES



Ao


Município de **RUSSAS-CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021-TP

A **SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI**, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, REGIS DINIZ, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **RUSSAS -CE**, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE, 28 DE JUNHO de 2021


SALES CAVALCANTE LIMA
 CPF:041.165.023-83
 SOCIO-ADMISTRADOR

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconhecimento de firma
 Nº 041.165.023-83
 Nº 041.165.023-83

Cartão
 Verificar por (s) firmas (s) semelhante verdadeira de: Sales Cavalcante Lima

Em local da Verdade
 TIANGUA-CE

28 JUN 2021

BELO STANISLAU DE OLIVEIRA S. LIMA - Oficial
 MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA - Oficial
 ANTONIO CARLOS DE FREITAS TELFER - Escrevente Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado



CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL RUSSAS - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - TP
DATA DA LICITAÇÃO 07 DE JULHO DE 2021
PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELADO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTARZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSE DA COSTA CELEDONIP, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSE IVANIR BESSA E RUA OMEGA NO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 783.714,77 (SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARTOZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023 - 83 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 07 DE JULHO DE 2021 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 29 DE JUNHO DE 2021

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO ,AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSEDA COSTA CELENDONIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSE IVANIR BESSA E RUA - BAIRRO LAGOA DO TOCONO MUNICIPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M²	12,00	125,72	155,25	1.863,00
1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFO (AREA ATE 5000M2)	M²	10.419,06	0,23	0,28	2.917,34
SUB - TOTAL							4.780,34
2 PAVIMENTAÇÃO							
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO)							
2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	9.463,39	53,64	66,24	626.854,95
2.2	365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mmX0,35mmX1,00m)	M	2.762,54	19,76	24,40	67.405,98
2.3	3232	RECONFORMAÇÃO /PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	10.419,06	0,06	0,07	729,33
SUB - TOTAL							694.990,26
3 DRENAGEM (SARJETAS)							
3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2 M	M³	95,85	37,80	46,68	4.474,28
3.2	836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	95,85	335,40	414,19	39.700,11
SUB - TOTAL							44.174,39
4 DIVERSOS							
4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M²	10.419,06	0,98	1,21	12.607,06
SUB - TOTAL							12.607,06
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	3.665,98	4.527,12	27.162,72
SUB - TOTAL							27.162,72
VALOR TOTAL COM BDI							783.714,77


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOA DO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	1937	M²	-	125,72	155,25	-
1.2	2873	M²	696,00	0,23	0,28	194,88
SUB - TOTAL						
PAVIMENTAÇÃO						
2.1	2893	M²	635,10	53,64	66,24	42.069,02
2.2	365	M	182,00	19,76	24,40	4.440,80
2.3	3232	M²	696,00	0,06	0,07	48,72
SUB - TOTAL						
DRENAÇÃO (SARJETAS)						
3.1	1256	M³	6,09	37,80	46,68	294,28
3.2	836	M³	6,09	335,40	414,19	2.522,42
SUB - TOTAL						
DIVERSOS						
4.1	3447	M³	696,00	0,98	1,21	842,16
SUB - TOTAL						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%						
5		MES	6,00	244,13	301,48	1.808,88
SUB - TOTAL						
VALOR TOTAL COM BDI						
						52.211,16

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSE IVANIR BESSA - BAIRRO LAGOA DO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M²	-	125,72	155,25	-
1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M2)	M²	435,54	0,23	0,28	121,95
SUB - TOTAL							121,95
PAVIMENTAÇÃO							
2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	384,73	53,64	66,24	25.484,52
2.2	365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mmX0,35mmX1,00m)	M	145,18	19,76	24,40	3.542,39
2.3	3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	435,54	0,06	0,07	30,49
SUB - TOTAL							29.057,40
DRENAGEM (SARJETAS)							
3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	5,08	37,80	46,68	237,13
3.2	836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	5,08	335,40	414,19	2.104,09
SUB - TOTAL							2.341,22
DIVERSOS							
4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	435,54	0,98	1,21	527,00
SUB - TOTAL							527,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00	155,21	191,67	1.150,02
SUB - TOTAL							1.150,02
VALOR TOTAL COM BDI							33.197,59

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060/28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPEONA
ENG. CIVIL
CREAM Nº 3745 - D



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
SERVÍCIOS PRELIMINARES							
1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M²	-	125,72	155,25	-
1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M²)	M²	744,30	0,23	0,28	208,40
SUB - TOTAL							208,40
PAVIMENTAÇÃO							
2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	692,20	53,64	66,24	45.851,33
2.2	365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mmX0,35mmX1,00m)	M	148,86	19,76	24,40	3.632,18
2.3	3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	744,30	0,06	0,07	52,10
SUB - TOTAL							49.535,61
DRENAGEM (SARJETAS)							
3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	5,21	37,80	46,68	243,20
3.2	836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	5,21	335,40	414,19	2.157,93
SUB - TOTAL							2.401,13
DIVERSOS							
4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M³	744,30	0,98	1,21	900,60
SUB - TOTAL							900,60
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00	256,88	317,22	1.903,32
SUB - TOTAL							1.903,32
VALOR TOTAL COM BDI							54.949,06

Handwritten signatures and initials

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041-165.023 -83
RG 20068-28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO
CREA Nº 3745 - D
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA RUA JOSE DA COSTA CELENDONIO BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICIPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M²	-	125,72	155,25	168,67
1.1	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFO (AREA ATE 5000M2)	M²	602,40	0,23	-	168,67
1.2							
SUB - TOTAL							
PAVIMENTAÇÃO							
2	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	549,69	53,64	66,24	36.411,47
2.1							
2.2	365	BANQUETA /MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mmX0,35mmX1,00m)	M	150,60	19,76	24,40	3.674,64
2.3	3232	RECONFORMAÇÃO /PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	602,40	0,06	0,07	42,17
SUB - TOTAL							
DRENAGEM (SARJETAS)							
3	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M³	5,27	37,80	46,68	246,00
3.1							
3.2	836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	5,27	335,40	414,19	2.182,78
SUB - TOTAL							
DIVERSOS							
4	3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M²	602,40	0,98	1,21	728,90
4.1							728,90
SUB - TOTAL							
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
5			MES	6,00	210,06	259,40	1.556,40
SUB - TOTAL							
VALOR TOTAL COM BDI							
							45.011,03

(Handwritten signatures and initials)


PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA NO BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICIPIO DE RUSSAS - CE

UN QUANT. VALOR UNIT. VALOR COM BDI TOTAL

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONIA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA



© 88 9 9377-8889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12




SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES		M²	-	125,72	155,25	-
1.1	1937	M²	-	0,23	0,28	829,79
1.2	2873	M²	2.963,52	-	-	829,79
SUB - TOTAL						
PAVIMENTAÇÃO						
2.1	2893	M²	2.682,16	53,64	66,24	177.666,28
2.2	365	M	815,90	19,76	24,40	19.907,96
		M²	2.963,52	0,06	0,07	207,45
2.3	3232		-	-	-	197.781,69
SUB - TOTAL						
DRENAGEM (SARJETAS)						
3		M²	28,28	37,80	46,68	1.320,11
3.1	1256	M²	28,28	335,40	414,19	11.713,29
3.2	836		-	-	-	13.033,40
SUB - TOTAL						
DIVERSOS						
4		M²	2.963,52	0,98	1,21	3.585,86
4.1	3447		-	-	-	3.585,86
SUB - TOTAL						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%						
5		MÊS	6,00	1.042,60	1.287,51	7.725,06
			-	-	-	7.725,06
SUB - TOTAL						
VALOR TOTAL COM BDI						
						222.955,80

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NO BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE					
SERVIÇOS PRELIMINARES							



SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12




SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

1.1	1937	PLACA PADRÃO DA OBRA	M ²	12,00	125,72	155,25	1.863,00
1.2	2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000M ²)	M ²	4.977,30	0,23	0,28	1.393,64
SUB - TOTAL							3.256,64
2 PAVIMENTAÇÃO							
2.1	2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	4.519,51	53,64	66,24	299.372,34
2.2	365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10mmX0,35mmX1,00m)	M	1.320,00	19,76	24,40	32.208,00
2.3	3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M ²	4.977,30	0,06	0,07	348,41
SUB - TOTAL							331.928,75
3 DRENAGEM (SARJETAS)							
3.1	1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M ³	45,92	37,80	46,88	2.143,55
3.2	836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M ³	45,92	335,40	414,19	19.019,60
SUB - TOTAL							21.163,15
4 DIVERSOS							
4.1	3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M ³	4.977,30	0,98	1,21	6.022,53
SUB - TOTAL							6.022,53
5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
5		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00	1.755,34	2.167,67	13.006,02
SUB - TOTAL							13.006,02
VALOR TOTAL COM BDI							375.377,09

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	150 DIAS	TOTAIS
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSE DA COSTA CELEND ONIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSEIVANIR BESSA E RUA - BAIRRO LAGOA DO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE							
	SALES CALVACANTE LIMA							
	ADMINISTRADOR							
	CPF 041.165.023 -83							
	RG 20060 28137825							
	PAULO LEITE BARBOSA PAMPOLINA							
	ENGENHEIRO CIVIL							
	CREA N° 3745							




© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

Handwritten signature

Handwritten signature

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	956,07	20,00%	956,07	15,00%	717,05	15,00%	717,05	15,00%	717,05	15,00%	717,05	0,61%
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	138.998,05	20,00%	138.998,05	15,00%	104.248,54	15,00%	104.248,54	15,00%	104.248,54	15,00%	104.248,54	88,22%
3	DRENAGEM (SARJETA)	20,00%	8.834,88	20,00%	8.834,88	15,00%	6.626,16	15,00%	6.626,16	15,00%	6.626,16	15,00%	6.626,16	5,64%
4	DIVERSOS	20,00%	2.521,41	20,00%	2.521,41	15,00%	1.891,06	15,00%	1.891,06	15,00%	1.891,06	15,00%	1.891,06	1,61%
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	5.432,54	20,00%	5.432,54	15,00%	4.074,41	15,00%	4.074,41	15,00%	4.074,41	15,00%	4.074,41	4,25%
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	156.742,95	20,00%	156.742,95	15,00%	117.557,22	15,00%	117.557,22	15,00%	117.557,22	15,00%	117.557,22	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	156.742,95	40,00%	313.485,90	55,00%	431.043,12	70,00%	548.600,34	85,00%	666.157,56	100,00%	783.714,77	100,33%

PAVIMENTAÇÃO EMPARALELADA NA RUA ÔMEGA - BAIRRO LAGOADO DO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE

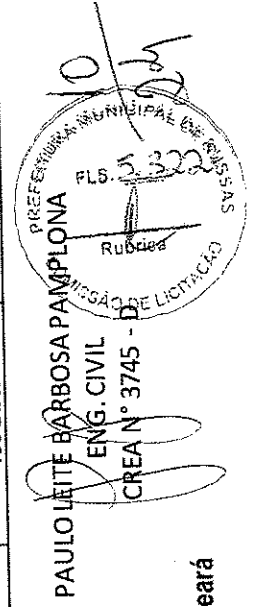

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
✉ sales_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

Handwritten marks and initials at the bottom of the page.



SAVIRE
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	38,98	20,00%	38,98	15,00%	29,23	15,00%	29,23	15,00%	29,23	15,00%	29,23	0,59%
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	9.311,71	20,00%	9.311,71	15,00%	6.983,78	15,00%	6.983,78	15,00%	6.983,78	15,00%	6.983,78	88,22%
3	DRENAGEM (SARJETA)	20,00%	561,34	20,00%	561,34	15,00%	421,01	15,00%	421,01	15,00%	421,01	15,00%	421,01	5,65%
4	DIVERSOS	20,00%	168,43	20,00%	168,43	15,00%	126,32	15,00%	126,32	15,00%	126,32	15,00%	126,32	1,29%
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	361,78	20,00%	361,78	15,00%	271,33	15,00%	271,33	15,00%	271,33	15,00%	271,33	4,25%
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	10.442,24	20,00%	10.442,24	15,00%	7.831,67	15,00%	7.831,67	15,00%	7.831,67	15,00%	7.831,67	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	10.442,24	40,00%	20.884,48	55,00%	28.716,15	70,00%	36.547,82	85,00%	44.379,49	100,00%	52.211,16	100,00%

Handwritten initials

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE IVANIR BESSA - BAIRRO LAGOA DO TOCONO, MUNICÍPIO DE RUISSAS - CE

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 047-165.023 -83
RG 20060/28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com


Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745

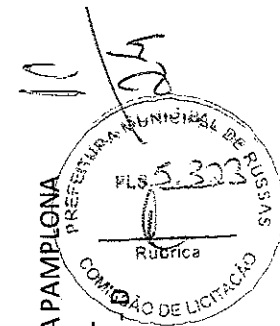


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		TOTAIS	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		% DO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	24,39	20,00%	24,39	15,00%	18,29	15,00%	18,29	15,00%	18,29	15,00%	18,29	0,59%	121,95
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	5.811,48	20,00%	5.811,48	15,00%	4.358,61	15,00%	4.358,61	15,00%	4.358,61	15,00%	4.358,61	88,22%	29.057,40
3	DRENAGEM (SARJETA)	20,00%	468,24	20,00%	468,24	15,00%	351,18	15,00%	351,18	15,00%	351,18	15,00%	351,18	5,65%	2.341,22
4	DIVERSOS	20,00%	105,40	20,00%	105,40	15,00%	79,05	15,00%	79,05	15,00%	79,05	15,00%	79,05	1,29%	527,00
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	230,00	20,00%	230,00	15,00%	172,50	15,00%	172,50	15,00%	172,50	15,00%	172,50	4,25%	1.150,02
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	6.639,51	20,00%	6.639,51	15,00%	4.979,63	15,00%	4.979,63	15,00%	4.979,63	15,00%	4.979,63		
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	6.639,51	40,00%	13.279,02	55,00%	18.258,65	70,00%	23.238,28	85,00%	28.217,91	100,00%	33.197,59	100,00%	33.197,59

(Handwritten signature)


PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICIPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	150 DIAS	TOTAIS
	SALES CALVACANTE LIMA ADMINISTRADOR CPF 041.165.023 -83 RG 20060 28137825							
	PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 8745 - D							



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12



ITEM	DESCRÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		TOTAL
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	41,68	20,00%	41,68	15,00%	31,26	15,00%	31,26	15,00%	31,26	15,00%	31,26	0,59%
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	9.907,12	20,00%	9.907,12	15,00%	7.430,34	15,00%	7.430,34	15,00%	7.430,34	15,00%	7.430,34	88,22%
3	DRENAGEM (SARJETAS)	20,00%	480,23	20,00%	480,23	15,00%	360,17	15,00%	360,17	15,00%	360,17	15,00%	360,17	5,65%
4	DIVERSOS	20,00%	180,12	20,00%	180,12	15,00%	135,09	15,00%	135,09	15,00%	135,09	15,00%	135,09	1,29%
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	380,66	20,00%	380,66	15,00%	285,50	15,00%	285,50	15,00%	285,50	15,00%	285,50	4,25%
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	10.989,81	20,00%	10.989,81	15,00%	8.242,36	15,00%	8.242,36	15,00%	8.242,36	15,00%	8.242,36	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	10.989,81	40,00%	21.979,62	55,00%	30.221,98	70,00%	38.464,34	85,00%	46.706,70	100,00%	54.949,06	100,00%

[Handwritten signature]

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSE DA COSTA CELENDONIO BAIRRO LAGOA DO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	DESCRÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		TOTAL
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.155.023 - 83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
 ✉ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 3745

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	33,73	20,00%	33,73	15,00%	25,30	15,00%	25,30	15,00%	25,30	0,59%	188,67
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	8.025,66	20,00%	8.025,66	15,00%	6.019,24	15,00%	6.019,24	15,00%	6.019,24	88,22%	40.128,28
3	DRENAGEM (SARJETA)	20,00%	485,76	20,00%	485,76	15,00%	364,32	15,00%	364,32	15,00%	364,32	5,65%	2.428,78
4	DIVERSOS	20,00%	145,78	20,00%	145,78	15,00%	109,34	15,00%	109,34	15,00%	109,34	1,29%	728,90
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	311,28	20,00%	311,28	15,00%	233,46	15,00%	233,46	15,00%	233,46	4,25%	1.556,40
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	9.002,21	20,00%	9.002,21	15,00%	6.751,66	15,00%	6.751,66	15,00%	6.751,66		
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	9.002,21	40,00%	18.004,42	55,00%	24.756,08	70,00%	31.507,74	85,00%	38.259,40	100,00%	45.011,03

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA NO BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	165,96	20,00%	165,96	15,00%	124,47	15,00%	124,47	15,00%	124,47	0,59%	829,79

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060/28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com


Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 3745





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

ITEM	PAVIMENTAÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		% DO TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
2		20,00%	39.556,34	20,00%	39.556,34	15,00%	29.667,25	15,00%	29.667,25	15,00%	29.667,25	15,00%	29.667,25	88,22%
3	DRENAGEM (SARJETÁ)	20,00%	2.606,68	20,00%	2.606,68	15,00%	1.955,01	15,00%	1.955,01	15,00%	1.955,01	15,00%	1.955,01	5,65%
4	DIVERSOS	20,00%	717,17	20,00%	717,17	15,00%	537,88	15,00%	537,88	15,00%	537,88	15,00%	537,88	1,29%
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	1.545,01	20,00%	1.545,01	15,00%	1.158,76	15,00%	1.158,76	15,00%	1.158,76	15,00%	1.158,76	4,25%
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	44.591,16	20,00%	44.591,16	15,00%	33.443,37	15,00%	33.443,37	15,00%	33.443,37	15,00%	33.443,37	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	44.591,16	40,00%	89.182,32	55,00%	122.625,69	70,00%	156.069,06	85,00%	189.512,43	100,00%	222.955,80	100,00%

[Handwritten signature]

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NO BAIRRO LAGOA DO TOCO NO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		180 DIAS		150 DIAS		% DO TOTAL
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	651,33	20,00%	651,33	15,00%	488,50	15,00%	488,50	15,00%	488,50	15,00%	488,50	0,59%
2	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	66.385,75	20,00%	66.385,75	15,00%	49.789,31	15,00%	49.789,31	15,00%	49.789,31	15,00%	49.789,31	88,22%
	TOTAIS													

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825



© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LESTE BARBOSA PAMPLONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 8745 - D



[Handwritten initials]



3	DRENAGEM (SARJETAS)	20,00%	4.232,63	20,00%	4.232,63	15,00%	3.174,47	15,00%	3.174,47	15,00%	3.174,47	15,00%	3.174,47	5,65%	21.163,15
4	DIVERSOS	20,00%	1.204,51	20,00%	1.204,51	15,00%	903,38	15,00%	903,38	15,00%	903,38	15,00%	903,38	1,29%	6.022,53
5	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	20,00%	2.601,20	20,00%	2.601,20	15,00%	1.950,90	15,00%	1.950,90	15,00%	1.950,90	15,00%	1.950,90	4,25%	13.006,02
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	75.075,42	20,00%	75.075,42	15,00%	56.306,56	15,00%	56.306,56	15,00%	56.306,56	15,00%	56.306,56		
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	75.075,42	40,00%	150.150,84	55,00%	206.457,40	70,00%	319.070,52	85,00%	375.377,09	100,00%	375.377,09	100,00%	375.377,09

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA RUA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, AV. NICANOR BALTAZAR DE OLIVEIRA, RUA JOSE DA COSTA CELENDONIO, RUA FRANCISCO ALDENIR DE JESUS, RUA JOSE IVANIR BESSA E RUA - BAIRRO LAGOADO TOCONO MUNICÍPIO DE RUSSAS - CE


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total
1937	PLACA PADRÃO DA OBRA				
					125,72
					M2

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.163.023 - 83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
✉ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0001	133,63	0,0134		
	TOTAL Equipam.	R\$	0,013				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,002	13,21	0,0264		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,026				
	Mão de Obra						
	0,026		0,022		0,0130		0,06
1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRAATE 2 M					37,80	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,545	13,21	20,4095		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	20,410				
	Mão de Obra						
	20,41		17,389				37,80
836	CONCRETO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					335,40	M3
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)						
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	12,32	8,80		
	TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	8,800				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	4,8505	13,21	64,08		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	64,080				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	1,456	33,20	48,34		
	CIMENTO PORTLAND	KG	338,000	0,38	128,44		
	PEDRISCO	M3	0,938	33,20	31,14		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	207,920				
	Mão de Obra						
	64,08		54,596	207,92	8,80		335,40
3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA					0,98	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,040	13,21	0,5284		

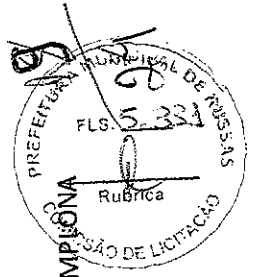

PAULO LEITE BARBOSA PAMPYONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, N° 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165/023 - 83
RG 20060-28137825



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
T O T A L MÃO DE OBRA		0,528				
Mão de Obra		0,53				0,98
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%					21,995,88	M2
MAO DE OBRA						
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	1,335	9,292,73	12,405,79		
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	3,784	2,534,38	9,590,09		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,995,880	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra		21,995,88				21,995,88
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%					6,00	3,665,98
MAO DE OBRA						
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,130	9,292,73	1,208,05		
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,1013	2,534,38	256,73		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,464,780	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra		1,464,78				1,464,78
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%					6,00	244,13
MAO DE OBRA						
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,0559	9,292,73	519,46		
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,0400	2,534,38	101,38		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	620,840	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Mão de Obra		620,84				620,84
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%					620,84	M2

20/11/14



PAULO LENTE BARBOSA PAMPLOMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 13745 - D



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%						4,00	155,21
MAO DE OBRA						1.027,52	M2
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,0833	9.292,73	774,08			
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,1000	2.534,38	253,44			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.027,520	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
Mão de Obra							1.027,52
1.027,52							256,88
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%						4,00	256,88
MAO DE OBRA						1.260,34	M2
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,108	9.292,73	1.003,61			
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,1013	2.534,38	256,73			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1.260,340	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
Mão de Obra							1.260,34
1.260,34							210,06
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%						6,00	210,06
MAO DE OBRA						6.255,61	M2
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,540	9.292,73	5.018,07			
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,4883	2.534,38	1.237,54			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6.255,610	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral
Mão de Obra							6.255,61
6.255,61							1.042,60


(Handwritten signatures and initials)


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060-78137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 3745 - D






ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%

MAO DE OBRA				10.532,04	M2
ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,910	9.292,73	8.456,38	
ENCARREGADO DE TURMA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMES	0,8190	2.534,38	2.075,66	
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10.532,040			
Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI
10.532,04					Total Geral
					10.532,04
				6,00	1.755,34

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
1 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1.1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	16,60%	20,97%	24,23%



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGI. CIVIL
CREAM nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20060 28137825

© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12





1.2	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABSTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1.4	OBRA SPONTUARIOS MARITIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
15.	FORNECIMENTO DE MATERIAISE EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%
ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%	4,01%	3,80%
1.1	SEGURO E GARANTIA	0,32%	0,40%	0,32%
1.2	RISCOS	0,50%	0,56%	0,50%
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,11%	1,11%
1.4	LUCRO BRUTO	6,64%	7,30%	6,64%
1.5	PIS, COFINS, E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	5,65%	6,65%	6,65%
1.6	BDI CALCULADO			23,49%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRICOAO	GRUPO A	
		HORISTA	MENSALISTA
AI	INSS	0,00	0,00
A2	SEST	1,50	1,50

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 - 83
RG 20050 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGENH. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



(Handwritten signatures and initials)

SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES



A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IN CRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Férias	3,41	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,71	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PARTERIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,36
B7	DÍAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDÊNCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 - 83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953
 ✉ salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

213
 214

FLS. 3.336

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISSA
